


# Programm Mali-Nord

## Projektbericht Nr. 12

### Technische & Finanzielle Zusammenarbeit

### Mai bis August 2000

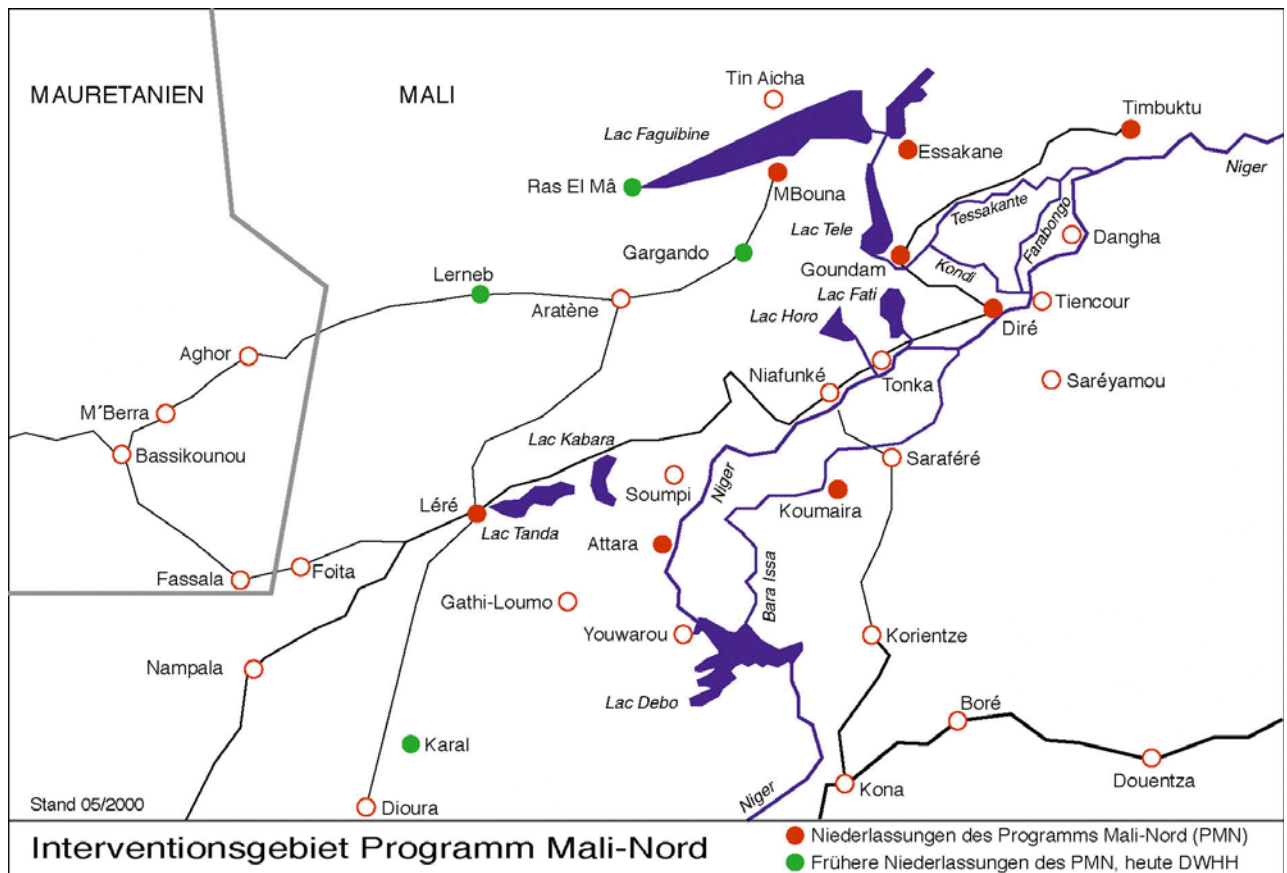

im Auftrag der  
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)  
RG 103

Henner Papendieck  
Barbara Rocksloh-Papendieck  
Berlin, September 2000

## Innentitel

Land	Mali
Projektbezeichnung	Programm Mali-Nord ("Entwicklung der Regionen des Nordens")
Anschrift	Coopération Allemande - Programmes Mali-Nord B. P. 100, Bamako, Tel 00223 23 09 71; Fax + 23 28 95 e-mail: <a href="mailto:malinord@afribone.net.ml">malinord@afribone.net.ml</a> website: <a href="http://www.programm-mali-nord.de">www.programm-mali-nord.de</a>
Projekt-Nr. TZ	PN 1996.2238.2 (zuvor: PN 1991.2210.2)
Angebot GTZ vom	1.07.1999; Auftrag BMZ vom 25.08.1999
Projektabschluss vom	6.10.1999; 03.01.2000
TZ Vertragsvolumen	DM 29,6 Mio
Phasen	I: 09/93 bis 08/96; II: 09/96 bis 04/97; III: 05/97 bis 08/99; IV: 08/99 bis 03/03
Projekt-Nr. FZ	Nord Mali II; PN 1996 651 75 (09/96 - 09/98) DM 4,7 Mio Nord Mali III; PN 1997 658 01 (01/98 - 03/00) DM 4,0 Mio Nord Mali IV PN 1999 656 09 (04/00 bis 09/02) DM 10,0 Mio
derz. DG/Kooperationen:	PAM (03/00 – 09/02): Food for Work PIV PAM (09/99 – 06/00): Schulkantinen
<b>Bericht</b>	<b>Nr. 12</b>
Berichtszeitraum	1. Mai bis 31. August 2000
Berichtsstichtag	31. August 2000
Projektträger	Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Bamako, Tel. 00223 – 222901
Verantwortlich	Ali Sankaré, Chargé de mission, Tel. 00223 – 222901 poste 12
Consulting	Dr. Henner Papendieck, Büro für Wirtschafts- und Sozialforschung Beerenstr. 3, D - 14163 Berlin, Tel. (030) 802 97 07, Fax 802 24 39 e-mail: <a href="mailto:H.Papendieck@imails.de">H.Papendieck@imails.de</a>
Vertragslaufzeit	bis 31. März 2003
AP	Dr. Henner Papendieck, Berlin
LZE	Dr. Barbara Rocksloh-Papendieck, Berlin
GTZ	RG 103
Auftragsverantwortlich	Regionalleiter Horst Hertel
Projektbearbeiter	Ekkehard Dudeck, Tel. (06196) 79-1926; Fax - 7175
KfW	L II b/1
Projektverantwortlich	Christoph Twerenbold, Tel. (069) 7431-3546, Fax -3748
BMZ	Referat 212 - Westafrika
zuständiger Referent	Herr Möllinghoff Tel. (0228) 535-3612; Fax -4612
Fachlich zuständig	Sektorreferat 416, Ländliche Entwicklung, Welternährung

Eschborn, im September 2000

---

Unterschrift des Projektverantwortlichen

## Inhalt

<b>Verzeichnis der Abkürzungen</b>	<b>iii</b>
<b>1. Zusammenfassung und Überblick</b>	<b>1</b>
<b>2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen</b>	<b>4</b>
<b>3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord</b>	<b>5</b>
<b>4. Das TZ-Programm</b>	<b>6</b>
<b>5. Das FZ- Programm Nord-Mali II + III</b>	<b>8</b>
<b>6. Das FZ-Programm Nord-Mali IV</b>	<b>8</b>
<b>7. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM)</b>	<b>12</b>
<b>8. Förderung der Kommunen</b>	<b>13</b>
<b>9. Prioritäten im Berichtszeitraum</b>	<b>14</b>
<b>10. Prioritäten für das kommende Halbjahr</b>	<b>15</b>
<b>11. Handlungsbedarf</b>	<b>15</b>



## Glossar der geographischen Begriffe

Bara Issa	Seitenarm des Niger, zwischen dem Lac Débo und Issafaye (bei Diré)
Bingha	Landschaft zwischen dem Issa Ber (großen Fluss) und seinem südlichen Seitenarm bei Diré
Daouna	Früherer See und Überlauf des Lac Faguibine südlich von M'Bouna zentraler Ort: Gargando; heute salpeterreiches Weidegebiet
Delta Moyen	Binnendelta des Niger von Diafarabé im Süden bis Niafunké im Norden
Farabongo	großer Seitenarm des Niger von Diré bis Korioumé
Gourma	Gebiet rechts des Niger
Haoussa	Gebiet links des Niger
Issa Ber	„großer Fluss“ (Songhoi), Hauptarm des Niger
Kessou	Landschaft zwischen dem Kondi und dem Farabongo nordöstlich von Diré
Mema	flaches Weidegebiet zwischen Dioura und Léré, der westliche Teil wird als „Mema Dioura“ bezeichnet (Dreieck: Dioura - Nampala - Léré); der östliche als „Mema Farimaké“ (Dreieck: Dioura - Gathi-Loumo - Léré)
Thilly	Landschaft südlich des Tessakante bei Douékiré
Tilemsi	flaches Weidegebiet nördlich von Léré; zentraler Ort: Lerneb
Tyoki	Landschaft zwischen dem Lac Horo und dem Lac Fati
Zone exondée	Trockenzone
Zone inondée	Überschwemmungsgebiet des Niger
Zone lacustre	Ufer- und Seen-Zone des Niger
Vallée du Fleuve	Flusstal des Niger

## Verzeichnis der Abkürzungen

AAA	Agro Action Allemande (=DWHH)
ACDI	Agence Canadienne pour le Développement International
ADEMA	Alliance pour la Démocratie au Mali (Regierungspartei: ADEMA-PASJ)
AEN	Aide de l'Eglise Norvégienne (norwegische Kirchenorganisation)
AFD	Agence Française de Développement
AFRICARE	Amerikanische ONG
AGETIPE	Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi
AMRAD	Association Malienne de Recherches Action pour le Développement (malische ONG)
APE	Association Parents Elèves
BID	Banque Islamique de Développement
BMZ	Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CAR	Centre d'Apprentissage Rural
CAR-Nord	Consolidation des Acquis de la Réinsertation (PNUD/CN)
CARE	Amerikanische NRO
CCC	Centre de Conseil Communal
CICR	Comité International de la Croix Rouge (Schweiz)
CN	Commissariat au Nord
DNHE	Direction Nationale de l'Energie et de l'Hydraulique
DRHE	Direction Régionale de l'Energie et de l'Hydraulique
DWHH	Deutsche Welthungerhilfe
ECHO	European Community Humanitarian Office
EU	Europäische Union
EZ	Entwicklungszusammenarbeit
FAO	Food and Agricultural Organisation
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FED	Fonds Européen de Développement
FENU	Fonds d'Equipeement des Nations Unies
FIDA	Fonds International de Développement Agricole (der FAO)
FZ	Finanzielle Zusammenarbeit
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
ISAG	Initiative de Sécurité Alimentaire à Goundam (Africare)
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
MATS	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité
MEATEU	Ministère de l'Equipeement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme
OMAES	Oeuvre Malienne et d'Aide à l'Enfance au Sahel (malische ONG)
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
PACCEM	Programme d'Appui à la Commercialisation de Céréales au Mali (ACDI)
PACR-T	Projet d'Appui au Communes Rurales - Tombouctou (FENU)
PADL-T	Programme d'Appui au Développement Local - Tombouctou (AFD)
PAM	Programme Alimentaire Mondial (=WEP)
PARENA	Parti Africain pour la Renaissance Nationale (Partei der Regierungskoalition)
PASJ	Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ)
PDZL	Projet de Développement Zone Lacustre (FIDA, Niafunké )
PIV	Périmètre Irrigué Villageois (dörfliche Bewässerungsanlage, im Schnitt etwa 30 ha)
PMN	Programm Mali-Nord
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PRMC	Programme de Restructuration des Marchés Céréaliers
PSCOMG	Projet Santé Communautaire de Goundam (Africare)
PTO	Projet Tombouctou Ouest (der DWHH)
SAP	Système d'Alerte Précoce (Frühwarnsystem) - eingerichtet beim MATS
TZ	Technische Zusammenarbeit
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nations International Children Fund
UNSO	United Nations Sahel Office
USAID	United States Agency for International Development
WEP	Welternährungsprogramm (=PAM)

## 1. Zusammenfassung und Überblick

*Ziel:* Ziel des Vorhabens ist es, den Prozess der sozialen und ökonomischen Stabilisierung in der von den Folgen der Tuareg-Rebellion besonders stark betroffenen Region von Timbuktu im Norden Malis weiterhin zu unterstützen.

*Phasen:* Im Anschluss an die drei Phasen des Nothilfvorhabens, insgesamt sechs Jahre (09/93 bis 08/99), erstreckt sich die vierte Phase des Vorhabens über 43 Monate (09/99 bis 03/2003).

*Programm:* Das Vorhaben konzentriert sich bis Frühjahr 2003 auf die nachhaltige Entwicklung im Flusstal des Niger und dessen Überschwemmungsgebieten. Es geht vor allem um Maßnahmen der Ernährungssicherung, insbesondere den Wiederaufbau und den Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft. Zugleich unterstützt das Programm die Ansätze zur Selbstverwaltung - der im September 1999 konstituierten ländlichen Gemeinden (*communes rurales*). Das Programm wickelte von Ende 1996 bis Frühjahr 2000 die FZ-Vorhaben Nord-Mali II (PN 1996 651 75) und III (PN 1997 658 01) ab: Aufbau der zerstörten Infrastruktur (Gesundheitsstationen, Schulen, Verwaltung). In seiner vierten Phase ist es für die Abwicklung des neuen FZ-Vorhabens Nord Mali IV (PN 1999 656 09 - Investitionen in Bewässerungslandwirtschaft und Infrastruktur) verantwortlich.

*Strategie:* Einkommensschaffende Maßnahmen sollen den zurückgekehrten Flüchtlingen (im wesentlichen Nomaden), den zurückgekehrten Vertriebenen (im wesentlichen Sesshaften) sowie den verarmten zurückgebliebenen Bevölkerungsteilen helfen, ihr wirtschaftliches und soziales Leben wiederaufzubauen (Zielgruppen). Die rasche Einbindung der arbeitsfähigen Zielbevölkerung in investive, arbeitsintensive und zugleich einkommensschaffende Maßnahmen soll die Eigenverantwortung der Zielbevölkerung und deren Selbsthilfewillen stärken, ethnische Konflikte vermeiden helfen und die Gefahr erneuter Gewalttätigkeiten verringern.

*Interventionsgebiet:* Das Flusstal, die Seitenarme und das Überschwemmungsgebiet des Niger von Attara/Niafunke im Westen bis Gourma-Rharous im Osten sowie dem Lac Faguibine im Norden. Das Programm Mali-Nord hat im August 1999 seine Aktivitäten in fünf Landgemeinden der *zone exondée* (zur mauretanischen Grenze hin) an die Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) übergeben. Die DWHH baut dort ein eigenständiges Programm auf und hat zu diesem Zweck die Niederlassungen des Programms Mali-Nord samt deren Personal übernommen.

*TZ:* Der Beitrag der TZ umfasste für die Laufzeit von 6 Jahren (3 Phasen von 09/93 bis 08/99) ein Volumen von DM 20,6 Mio. Für die vierte Phase des Programms (43 Monate von 09/99 bis 03/03) stehen zusätzlich DM 9,0 Mio zur Verfügung; samt zusätzlicher Mittel der TZ (vor allem Nahrungsmittelhilfe) sind bis heute DM 31,3 Mio für dieses Vorhaben zur Verfügung gestellt worden, von denen 80 % abgeflossen sind.

*FZ:* Aus Mitteln der FZ standen bis März 2000 insgesamt DM 8,7 Mio zur Verfügung (Notprogramm Nord-Mali II: DM 4,7 Mio; Nord-Mali III: DM 4 Mio). Das fast abgeschlossene Wie-

deraufbauprogramm umfasst 46 Schulen, Gesundheitsstationen und Rathäuser von 16 *arrondissements* (heute rund 30 Gemeinden - *communes rurales*) auf dem Lande. Das Bauprogramm (haltbare Bauten aus verbessertem lokalem Material) steht unter der technischen Aufsicht eines malischen Teams von Architekten. 45 Bauten sind abgenommen, 1 Gebäude ist zum Berichtsstichtag noch nicht vollständig fertiggestellt.

Seit dem 1. April 2000 stehen im Rahmen des Notprogramms Nord Mali IV (Laufzeit 30 Monate: 04/00 bis 09/02) DM 10 Mio zur Verfügung, DM 6 Mio sind für den Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft bestimmt, DM 1,5 Mio für ein Bauprogramm, DM 2,5 Mio für die Operationskosten des Programms. Für die laufende landwirtschaftliche Saison sind 21 Bewässerungssperimeter mit einer Fläche von 600 Hektar hergerichtet worden. 16 Mare (Bodensenken) mit einer kultivierbaren Fläche von insgesamt 4.500 Hektar sind rechtzeitig vor Beginn der Flutwelle und der Regen eingedeicht und mit Wehren versehen worden. Die Regenzeit lässt sich bislang (August) gut an. Die Aussichten für gute Erträge im laufenden Jahr sind günstig. Im Rahmen des neuen Bauprogramms sind acht der insgesamt achtzehn vorgesehenen Bauaufträge erteilt worden. Der erste Bau, das Rathaus von Nampala, ist inzwischen fertiggestellt und abgenommen.

*Bedeutung:* Das Programm Mali-Nord ist das größte Projekt zur Überwindung des bewaffneten Konfliktes und seiner Folgen in Mali. Im Westen von Timbuktu hat es zur Befriedung und Stabilisierung wesentlich beigetragen. Wichtig war dabei:

- Es hat den Schwerpunkt von Anfang an auf die wirtschaftliche Wiederbelebung und auf investive (vor allem arbeitsintensive) Maßnahmen gelegt und hat sich seit 1997 in seinem Projektgebiet zu einem flächendeckenden Ernährungssicherungsprogramm entwickelt.
- Die Zielbevölkerung bestimmt in hohem Maße mit und ist in einem Programm-Beirat vertreten. Sie betrachtet das Programm fast als ihr eigenes (ownership); damit erklärt sich auch die hohe Motivation.
- Die Mittel für wirksames Eingreifen standen immer in hinreichendem Umfang zur Verfügung (GTZ/KfW sowie ECHO/UNHCR/PAM).
- Das Programm arbeitet dezentral über seine derzeit sieben, demnächst acht Niederlassungen in der Projektregion.

<b>Finanzierungen Programm Mali-Nord: GTZ, KfW, ECHO, UNHCR, PAM</b>					
<b>1. Abgeschlossene Finanzierungen</b>					
	<b>Projekt Nr.</b>	<b>Beginn</b>	<b>Ende</b>	<b>DM</b>	<b>IST</b>
TZ Phase 1	91.2210.2	1993	1996	7.800.000	100%
TZ Phase 2	91.2210.2	1996	1997	4.900.000	100%
TZ Phase 3	96.2238.2	1997	1999	7.900.000	100%
TZ NMH	98.3825.5	1998	1998	1.532.000	100%
KfW II	96 651 75	1996	1998	4.700.000	100%
ECHO	Nr. 1 - 7	1996	1999	7.830.304	100%
UNHCR bilaterale Mittel (BMZ)		1996	1998	1.077.909	100%
UNHCR multilaterale Mittel		1996	1999	2.878.827	100%
WEP *	Nr. 1 - 4	1996	1999	1.778.558	100%
<b>Σ abgeschlossene Finanzierungen</b>				<b>40.397.598</b>	<b>100%</b>
<b>2. Laufende Finanzierungen</b>					
	<b>Projekt Nr.</b>	<b>Beginn</b>	<b>Ende</b>	<b>DM</b>	<b>IST</b>
TZ Phase 4	96.2238.2	1999	2003	9.000.000	35%
Dezentralisierung	96.2223.4	1999	2000	700.000	60%
KfW III	97 658 01	1998	2000	4.000.000	98%
KfW IV	99 656 09	2000	2003	10.000.000	20%
WEP V *	Kantinen	1999	2000	100.000	100%
WEP FFW 00/02 *	Landwirtsch.	2000	2003	1.000.000	30%
<b>Σ laufende Finanzierungen</b>				<b>24.800.000</b>	<b>39%</b>
<b>3. Abgeschlossene und laufende Finanzierungen</b>					
				<b>DM</b>	
<b>Insgesamt</b>				<b>65.197.598</b>	
davon bilateral				51.609.909	79%
davon multilateral				13.587.689	21%
* Alle Beiträge des Welternährungsprogramms (WEP) werden in Naturalien erbracht: Hirse, Öl, Fisch etc.					

## 2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen

Am 22. Mai 2000 raubten schwer bewaffnete Banditen (zum ersten Mal) ein Fahrzeug des Programms Mali-Nord. Der Vorfall ereignete sich bei Aratène, nördlich von Léré. Die Banditen waren Araber, wahrscheinlich aus dem Osten (Tilemsi). Niemand wurde verletzt.

Die drei Niederlassungen des Programms in Léré, M'Bouna und Essakane wurden während des gesamten Berichtszeitraums von Sicherheitskräften bewacht. Für Fahrten in den Norden wurde Begleitschutz angefordert. Die Mehraristeneinheit in Léré erhielt in diesem Zusammenhang Hilfestellungen für die Reparatur und den Betrieb ihrer Fahrzeuge.

Im Mai wurde die Arbeit an der Web-Seite des Programms beendet. Seither ist sie unter der Anschrift [www.programm-mali-nord.de](http://www.programm-mali-nord.de) im Internet zu besichtigen. Die Seite wird recht lebhaft besucht. Im Juni waren es 19.800 hits, 1.741 pageviews und 288 sessions.

Auf Einladung von Professor Trutz von Trotha schrieben die Berichtersteller im Juni für den Reader zu der Tagung „Die Wunden der Gewalt verheilen“ in Onati (April 2000) einen Beitrag in englischer Sprache: "Peace and Aid. The Programme Mali-Nord and the Search for Peace in Northern Mali".

In der ersten Juni-Woche unternahm eine kleine malische Delegation (Ali Sankaré, Aghatam Ag Alassane, Yehia Ag Mohamed Ali) eine Fortbildungsreise nach Deutschland. Diese Reise bot Gelegenheit zu Besuchen im BMZ, der GTZ und der KfW. Die Delegation stattete auch der EXPO 2000 einen Besuch ab, um den kleinen Stand des Programms Mali-Nord im Global House zu besichtigen.

Im Juni legte der von der GTZ beauftragte Gutachter, Herr Diarra, seine Untersuchung der in Léré gegenwärtig benötigten Finanzdienstleistungen vor. Darin schlägt er für Léré eine dezentrale und unabhängige Finanzinstitution vor, aus der sich im Laufe der Jahre eine ländliche Bank entwickeln könnte. Die faktische Darstellung wie die Schlussfolgerungen der Studie scheinen dem Programm Mali-Nord wirklichkeitsnah und plausibel.

Anfang Juli kehrte Mohamed Mahmoud El Oumrany, der Repräsentant der Berabiche-Fraktionen (Araber) im Westen Timbuktus von seiner Friedensmission in Mauretanien zurück. Sie hatte weit länger gedauert als vermutet, endete aber mit dem Abschluss einer Vereinbarung, die dem harten Kern der Friedensverweigerer in M'Berra den Boden entziehen dürfte. Herr Mohamed Mahmoud El Oumrany ist im August in den Programmbeirat aufgenommen worden und vertritt dort die Interessen seiner Bevölkerungsgruppe.

Vom 23. Juli bis 1. August unternahm der Minister Soumaila Cissé mitsamt einer größeren Delegation von chargés de mission und conseillers seines Ministerium eine Reise in den Norden, die ihn vom 27. Juli (Gourma-Rharous) bis 1. August (Léré) durch das Projektgebiet führte. Er besichtigte Maßnahmen des Programms in Gourma-Rharous, Goundam, Diré und Léré. Nach dem Abschluss seiner Reise urteilte er seinem Kabinett gegenüber: „l'utilité du Programme Mali-Nord est indiscutable“.



Vom 7. bis 9. August 2000 fand in Bamako das alljährliche Auswertungsseminar des Programms statt. Der deutsche Botschafter und der Minister Soumaila Cisse (MEATEU) eröffneten das Seminar. Die Projektleitung und die Leiter aller Niederlassungen stellten die Arbeit des vergangenen Jahres vor. Der Beirat äußerte sich am Ende des Seminars zufrieden.

Der Beirat unterstrich die Bedeutung von Gourma-Rharous für den Friedensprozess und empfahl, dort zumindest eine kleine Vertretung des Programms vorzusehen (und ggf. die in Timbuktu an ihrer Stelle aufzulösen). Er hat die Absicht, in der zweiten Oktoberhälfte eine Kommission dorthin zu entsenden, um diese und andere Fragen mit den Vertretern der Kommunen und der Bevölkerung zu diskutieren.

Die grundsätzlichen Proportionen des Investitionsprogramms der kommenden zwei Jahre wurden diskutiert und vereinbart: Attara 10 %, Gourma von Niafunké, 20 %, Diré Central (+ Tonka) 15 %, Gourma von Diré 15 %, Gourma von Rharous 10 %, Kessou 15 %, Goundam (inkl. Télé) 10 %, Reserve 5 %. Die verbindliche Einzelplanung soll bei einem Treffen in Diré Anfang November 2000 in Anwesenheit der KfW festgelegt werden. Der Beirat empfahl, die bevorstehende Ausschreibung für Motorpumpen (für die Jahre 2001 und 2002) auf 42 Aggregate à 4 Zylinder und 24 Aggregate à 2 Zylinder zu beziffern.

Im Juli hatte eine Reise des Programms in das Gebiet zwischen dem Kondi, dem Tessakant und dem Fara Bongo als besten Standort für die vorgesehene Niederlassung des Programms das Gelände eines seit vielen Jahren verlassenen Centre d'Apprentissage Rural (CAR) in Tin Zongho, einer kleinen Ansiedlung gegenüber von Douékiré, ermittelt. Es ist von der Strasse wie vom Fluss her gut zugänglich.

Beirat, Ministerium und die regionale Regierung von Timbuktu begrüßen die Gründung dieser Niederlassung. El Kassim Ag Hadé, ein Tuareg aus Tin Telout, soll sie leiten, als Assistent ist ein Sonhrai aus Douékiré vorgesehen. Herrichtung und Ausbau haben im August begonnen. Die Niederlassung soll im Oktober ihre Arbeit aufnehmen.

### **3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord**

*Projekträger:* Im Februar 2000 gab es eine Regierungsumbildung. Seither ist das *Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme* (MEATEU) zuständig. Minister Soumaila Cissé interessiert sich ebenso wie sein Vorgänger, Mohamed Ag Erlaf, persönlich für das Vorhaben. Er stammt aus Banikane, Kreis Niafunké. Aus zwei Anlässen hat er das Programm bereits im Felde kennengelernt. Das Projektteam hat er beauftragt, für den November eine Reise in den Gourma von Niafunké vorzubereiten. Ali Sankaré, früherer *Chef de Cabinet* im Umweltministerium, begleitet unverändert das Programm Mali-Nord; im vergrößerten neuen Ministerium nun als *Chargé de Mission* und Kabinettsmitglied. Das Programm Mali-Nord arbeitet weiterhin unter günstigen institutionellen Bedingungen.

*Beirat:* Die Kontinuität wahrt der Programm-Beirat (*comité consultatif*). Das Ministerium ist an den Ansichten des Programm-Beirats interessiert und sein *chargé de mission* spielt in ihm eine aktive Rolle.

*Projektgebiet:* Aus den sechzehn *arrondissements* des Projektgebiets im Westen und Südwesten von Timbuktu sind seit den Kommunalwahlen (Anfang Juni) dreißig ländliche Gemeinden entstanden. Fünf dieser Gemeinden (an der mauretanischen Grenze) wurden im Herbst 1999 in das neue Programm der DWHH übernommen. Das Programm Mali-Nord hat im Gegenzug seine Intervention im Rahmen des neuen FZ-Programms auf den Gourma von Niafunké sowie auf einen Teil des Kreises von Gourma-Rharous ausgeweitet. Dadurch sind neun Landgemeinden hinzugekommen. Künftig fallen 34 Landgemeinden in das unmittelbare Interventionsgebiet des Programms Mali-Nord, rechnet man die von Einzelmaßnahmen mitbetroffenen Nachbargemeinden mit hinzu, die am Rande des Interventionsgebietes liegen (Nampala, Gathi-Loumo, Boré usw.), so liegt die Zahl über 40.

*Niederlassungen:* Das Programm betreibt derzeit acht Niederlassungen (*antennes*). Die Leiter der Niederlassungen stammen aus der sozialen Umgebung der jeweiligen Niederlassung. Die ethnische und soziale Herkunft der Leiter spiegelt die Bevölkerungszusammensetzung des Interventionsgebietes wider. Eine Einrichtung besteht aus einem eingefassten, gemieteten Gelände mit einem oder zwei festen Gebäuden, einem kleinen Wirtschaftshof, einem Lager, einem Büro mit Tresor, einem *chambre de passage* sowie Logistik und Funkverbindung. Niederlassungen befinden sich in: Léré, M'Bouna, Farach, Goundam, Diré, Attara, Koumaira und Tin Zongho.

*Arbeitsweise:* Die Mitarbeiter des Programms handeln im direkten Kontakt mit der Zielgruppe. Jeder *chef d'antenne* verfügt im Rahmen eines verbindlichen Gesamtprogramms über ein eigenes, monatlich abgestimmtes Budget. Das Projekt schließt mit den Zielgruppen gegenseitig bindende Verträge auf möglichst dezentraler Ebene ab und lässt den Zielgruppen selbst so viel Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum wie möglich. In dem gesamten Programm arbeiten zwei entsandte Experten als Koordinatoren. Alle anderen Leistungen erbringen die rund 60 fest angestellten malischen Mitarbeiter. Hinzu kommen zehn malische Dienstleistungs- und Bauunternehmen (als permanente Vertragspartner), mit ihrerseits mehr als hundert Mitarbeitern und schließlich die Zielbevölkerung selbst mit vielen tausend Arbeitskräften (*bras valides*).

*Finanzierung:* Nach einer fünf Jahre andauernden Periode der Nothilfe und der multilateralen Zusammenarbeit (UNHCR, ECHO) von 1995 bis 1999 hat sich das Programm Mali-Nord seit dem April 2000 in ein Projekt der vornehmlich bilateralen malisch-deutschen Zusammenarbeit zurückverwandelt, das in der Kombination von FZ und TZ (bzw. der Kooperation von KfW und GTZ) wurzelt. Die Nahrungsmittellieferungen des Welternährungsprogramms ergänzen diese Kooperation sinnvoll.

#### **4. Das TZ-Programm**

Aus den Mitteln der TZ unterhält das Programm Mali-Nord seine Niederlassungen im Projektgebiet und ein Büro in Bamako, zehn Geländewagen, zwei Dutzend Motorräder, vier Motorpinassen, drei Flusspontons sowie sein Funknetz im Westen Timbuktus, bezahlt seine Mitarbeiter und finanziert vielfältige Einzelmaßnahmen der Wiederansiedlung, der Versorgung (Wasserversorgung, Gesundheit, Tiergesundheit, Schulen), des Wiederaufbaus, der

wirtschaftlichen Wiederbelebung und der Steigerung wie des Schutzes der landwirtschaftlichen Produktion (Schädlingsbekämpfung).

Das Spektrum der Maßnahmen variiert nach Standort und Dauer der Arbeit in dem jeweils betroffenen Gebiet. Maßnahmen der Nothilfe sind zur seltenen Ausnahme geworden (nur noch in Teilgebieten um den Lac Faguibine herum, wo die letzten Vertriebenen in ihre Ursprungsdörfer zurückkehren). Sie könnten durch die sich anbahnende Rückkehr der letzten arabischen Verbliebenen aus M'Berra (man spricht von 3.500 Menschen) in den Norden der Region von Timbuktu jedoch nochmals aufleben.

Maßnahmen der Ernährungssicherung stehen im Vordergrund. Das Interventionsgebiet des Programms ist das Überschwemmungsgebiet des Niger. Das wirtschaftliche (Über-)Leben hängt allein von Ernten ab. Weder die Regenfälle, noch die Flutwelle des Niger sind kontrollierbar. Jeder Standort muss individuell und rasch auf sie reagieren; die Niederlassungen des Programms mit ihnen: Engpässe in den Zuläufen sind zu beheben, sobald die Flut sich aufstaut (typisches Problem der Zulaufkanäle zum Faguibine).

Die großen Aktionen des vergangenen Berichtszeitraums, die Aushebung der Zulaufkanäle zum Faguibine und der Kampf gegen die Ratten im Faguibine und im Télé, zeigten Erfolg. Gegen alle Erwartungen säten die Bauern nach dem Ende der Rattenkampagne auch noch ein drittes Mal aus und fuhren nach 90 Tagen an den meisten Orten des Faguibine eine beachtliche Maisernte ein. Damit war die Gefahr einer Hungersnot gebannt.

Einer der Schwerpunkte des TZ-Programms lag im Berichtszeitraum auf der ländlichen Wasserversorgung. Viele zur Zeit des Rückstroms der Flüchtlinge nur notdürftig hergerichtete Weidebrunnen verlangen inzwischen ernsthaftere Investitionen, aber auch die vor einigen Jahren gebauten Brunnen zur Trinkwasserversorgung am Lac Faguibine sind zu konsolidieren, zu vertiefen bzw. durch weitere Brunnen zu ergänzen. In M'Bouna und Essakane sind an 14 Brunnen solche Arbeiten durchgeführt worden. Neben Léré konzentrierten sich auch die Niederlassungen in M'Bouna (10 Brunnen) und Essakane (7 Brunnen) auf den Brunnenbau.

Die Erwartung, in dem der DWHH überlassenen Gebiet werde deren „Programm Tombouctou Ouest“ (PTO) die frühere Arbeit des Programms Mali-Nord fortsetzen, erfüllt sich nur sehr bedingt. Bevölkerungsteile, die zuvor Zuschüsse des Programms Mali-Nord erhalten haben, werden nicht weiter begleitet, sondern (gerade im Brunnenbau) von weiterer Förderung ausgeschlossen. Die DWHH verfolgt einen radikal anderen Ansatz als das Programm Mali-Nord zuvor: Sie konzentriert sich auf wenige und aufwendige Investitionsvorhaben.

Die Zuschüsse zum privaten Hausbau (Lieferung von Türen und Fenstern) waren im Berichtszeitraum wiederum sehr begehrt. Die Schwerpunkte lagen am Lac Faguibine. Am Lac Faguibine ist die Nachfrage so groß, dass die Anrainer-Gemeinden inzwischen vorschlagen, in Tin Aicha eine Werkstatt für die Fertigung von Türen und Fenstern einzurichten. Daneben waren einzelne Nomadenansiedlungen im Westen betroffen: Dofana und Inasrakine.

Im Berichtszeitraum bezuschusste das Programm die Reise einer größeren arabischen Delegation aus Mali nach Mauretanien. Die daraus resultierenden vier Wochen dauernden Ver-

handlungsrunden in M'Berra und in Nouakchott könnten die Rückführung der letzten Flüchtlinge nach Mali und die endgültige Schließung des Lagers von M'Berra zur Folge haben.

Zunächst ist jedoch eine „Rencontre Intercommunautaire“ geplant, die voraussichtlich Ende September in Timbuktu stattfinden soll. Dort wollen die Berabiche mit den großen Vertretern aller anderen Volksgruppen im Norden Malis aushandeln, welchen Platz sie in diesem Raum künftig einnehmen können und sollen. Das Programm bezuschusst dieses Treffen mit FCFA 14 Mio (TDM 40).

## **5. Das FZ- Programm Nord-Mali II + III**

Die Notprogramme Nord-Mali II und Nord-Mali III umfassten ein Mittelvolumen von DM 8,7 Mio. Nach Abzug der Consulting-Kosten der GTZ standen aus beiden Zuwendungen für die Bauarbeiten netto insgesamt DM 6,7 Mio zur Verfügung. Das Bauprogramm umfasste 46 öffentliche Bauvorhaben. Im Berichtszeitraum sind die letzten Gebäude fertiggestellt worden. Abzuwickeln sind noch einige Nacharbeiten.

An Restmitteln verbleiben derzeit etwas mehr als FCFA 20 Mio. Sie sollen für die Sanierung des Marktes in Léré verwandt werden. Die topographischen Arbeiten konnten in der Regenzeit nicht zur Zufriedenheit abgeschlossen werden. Sie werden im Oktober wiederaufgenommen. Die (arbeitsintensiven) Tiefbauarbeiten sollen im November beginnen, sie werden voraussichtlich bis Februar 2001 andauern. Danach stehen die letzten endgültigen Bauabnahmen sowie der Schlussbericht an.

## **6. Das FZ-Programm Nord-Mali IV**

Die Planung und die Vorbereitung der konkreten Maßnahmen für das Jahr 2000 hatten bereits im Herbst 1999 begonnen. Im April lagen alle technischen Studien vor, die Verträge für alle Perimeter waren unterschrieben und die Arbeiten waren bereits im Gange.

Das umfangreiche Programm 2000 (siehe Tabelle auf der folgenden Seite) umzusetzen, hat im Berichtszeitraum alle Kraft in Anspruch genommen. Trotz des schwierigen Terrains ist es gelungen, alle wesentlichen Lieferungen rechtzeitig vor Ort zu haben: Werkzeug, Baumaterial, Saatgut, Düngemittel, Diesel, Schmierstoffe und schließlich die Motorpumpen, die von der GTZ vorfinanziert worden waren. Bis auf drei Motorpumpen, die derzeit geliefert und installiert werden (im Tessakant), waren alle Motorpumpen bereits in Diré und wurden installiert, sobald die Pumpenwärter an den Maschinen angelernt und die Anzahlungen für die Pumpen geleistet waren.

Nr.	PIV	Fläche (ha)	Nr.	Mare	Fläche (ha)
<b>Sektor Attara-Niafunké</b>					
1	Attara *	30	1	Edouarak	50
2	Groupe Idriss *	30	2	Gourou Sekou	100
3	Kassoum	30	3	Naouraganda	60
4	Kourouba II	30			<b>210</b>
5	Toubel	30			
		<b>150</b>			
<b>Sektor Niafunké-Diré</b>					
6	Atta	<b>20</b>			
<b>Sektor Diré-Dangha</b>					
7	Arkassedji II	20	4	Digar	120
8	Balandani	35	5	Sotel	50
9	Issafaye Acha Fagui	25	6	Bora	80
10	Kel Taoutala II, Arkassedji III	30	7	Banibangou	300
		<b>110</b>	8	Fonkoura - Kel Dourgou II	250
					<b>800</b>
<b>Sektor Gourma-Rharous</b>					
11	Fararou	40	9	Bazagarma	68
12	Madiakoy	35	10	Banguel Tibo	133
13	Samar I **	40	11	Tibi	90
14	Samar II **	36			<b>291</b>
		<b>151</b>			
<b>Sektor Aroukana - Tchili - Arhangoi</b>					
15	Dag Allal	20	12	Dibla	20
16	Egar Zaz	20	13	M'Baba	30
17	Gallaga	20			<b>50</b>
		<b>60</b>			
<b>Sektor Gourma von Niafunké</b>					
18	Koumaira	40	14	Wako Lélèle	150
19	Saraféré	30	15	Baya (Studie liegt vor)	
		<b>70</b>			<b>150</b>
<b>Sektor Binga</b>					
20	Chirfiga Village	20	16	N'Gouta	<b>3000</b>
21	Milala	20			
		<b>40</b>			
<b>Total</b>		<b>601</b>			<b>4.501</b>

\* Motorpumpen für diese Perimeter waren bereits vorhanden..

Neben den Bewässerungsperimetern sind im Berichtszeitraum 16 Mare bearbeitet worden. Hierbei lag der Schwerpunkt in Diré. Dort finden sich die meisten *mares fluviales* - tiefe Bodensenken, die regelmäßig vom Fluss überschwemmt werden. Die Bauarbeiten mussten früher als vermutet abgeschlossen sein, weil der Wasserpegel des Niger in dieser Saison früher anstieg als im vergangenen Jahr. Es ist gelungen, die Baumaßnahmen an allen Deichen und Wehren rechtzeitig zu beenden. Knapp vor der Überflutung begann es im Projektgebiet zu regnen. Die Bauern konnten rechtzeitig säen und der Schwimmreis begann zu keimen, bevor er überflutet wurde (sonst ertrinkt er). Die Hoffnung auf guten Ertrag scheint berechtigt.

### *Mechanisierung*

Größtes Einzelvorhaben der TZ war zuvor das Mechanisierungsprogramm. Inzwischen zählt dies zum FZ-Vorhaben. Es konzentriert sich auf die Interventionszonen des Programm Mali-

Nord im Flusstal des Niger. Für die Bevölkerung im Flusstal des Niger sind die Motorpumpen für die Bewässerungslandwirtschaft das wichtigste Element des Programms Mali-Nord. Zu den 150 Motorpumpen, die bis 1999 über das Programm Mali-Nord importiert worden sind, haben sich im Berichtszeitraum weitere 17 hinzugesellt (Aggregate der Marke Lister/Petter). Die Ausschreibung für die Jahre 2001 und 2002 ist veranlasst: 42 Aggregate mit einer Pumpleistung von 600 m<sup>3</sup>/h und 24 Aggregate mit einer von 300 m<sup>3</sup>/h sind vorgesehen.

In der Saison 2000 liegen die von den Nutzergemeinschaften zu zahlenden Preise je nach Typ zwischen FCFA 2 und 3 Mio, das entspricht 35 % des Weltmarktpreises. Die Rückzahlungsquoten sind hoch.

Die *Garage de Mechanique Agricole* (GMA), eine private Werkstatt in Diré bildet im Auftrag des Programms die *pompistes* (Maschinisten) aus. Dank regelmäßiger Wartung durch die gleiche Werkstatt waren bislang keine Ausfälle zu verzeichnen. 38 neue Maschinisten für das Programm 2000 haben eine zweiwöchige Grundausbildung erhalten. Alle früher ausgebildete Maschinisten (insgesamt knapp 300) haben im Berichtszeitraum einen Fortbildungskurs absolviert.

Die Reisschälmaschinen erweisen sich als wichtige Investition. Während ungeschälter Reis (*Paddy*) sich nur schleppend und zu niedrigen Preisen verkauft, gibt es eine lebhaftere Nachfrage nach geschältem Reis. Die arabischen Händler, die den Wochenmarkt in Attara dominieren, nehmen geschälten und zusätzlich handverlesenen Reis zu guten Preisen auf ihren sonst leer zurückrollenden LKW nach Mauretanien mit. Um die Schälkapazität der lokalen Produktion anzupassen, sind im Berichtszeitraum zwei weitere Schälmaschinen für Attara bestellt worden. Dort hat sich nämlich ein Lagerbestand von 2.000 Tonnen Paddy angesammelt, den es dringend abzubauen gilt.

### *Bauprogramm*

Das Bauprogramm soll abrunden, was mit den Notprogrammen Nord-Mali II und III begonnen und bereits weitgehend abgeschlossen worden ist. Neben der Fertigstellung einiger Gebäude, die bereits in vorangegangenen Plänen figurierten (Rathaus und Gesundheitsstation in Tin Aicha, zweiter Schulblock in Attara), geht es in der kommenden Phase vornehmlich um Rathäuser und zwar in folgenden Kommunen:

Bauprogramm					Auftragswert	
Kosten- stelle	Kos- tenart	Ort	Bauten	Art	in Mio FCFA	in DM
<b>3100</b>	<b>Sektor Attara-Niafunké</b>					
3101	201	Soumpi	Rathaus mittel	geplant	18,0	54.054
3102	201	Attara	Schule	erteilt	26,6	79.880
<b>3200</b>	<b>Sektor Niafunké-Diré</b>					
3201	201	Tonka	Rathaus mittel	geplant	18,0	54.054
3202	201	Tindirima	Rathaus klein	erteilt	15,7	47.147
<b>3500</b>	<b>Sektor Gourma-Rharous</b>					
3501	201	Hanzakoma	Rathaus mittel	geplant	19,0	57.057
3502	201	Rharous	Rathaus mittel	geplant	19,0	57.057
<b>3600</b>	<b>Sektor Aroukana-Tchilli-Arhangoi</b>					
3601	201	Douékiré	Rathaus mittel	geplant	18,0	54.054
3602	201	Kondi	Rathaus klein	erteilt	15,7	47.147
<b>3700</b>	<b>Sektor Gourma Niafunké</b>					
3702	201	N'Gorkou	Rathaus mittel	erteilt	18,2	54.655
<b>3800</b>	<b>Sektor Binga</b>					
3801	201	Kirchamba	Rathaus klein	geplant	17,0	51.051
3802	201	Sareyamou	Rathaus mittel	geplant	19,0	57.057
<b>3900</b>	<b>Diverse</b>					
3901	201	Tin Aicha	Rathaus mittel	erteilt	18,7	56.156
3902	201	Toukabangou	Rathaus mittel	geplant	18,7	56.156
3903	201	Dianké	Rathaus mittel	geplant	18,0	54.054
3904	201	Nampala	Rathaus klein	fertig	15,1	45.345
3905	201	Tin Aicha	Gesundheitsstation	erteilt	30,5	91.592
3906	201	Boré	Rathaus mittel	erteilt	18,2	54.655
3907	201	diverse	Dachabdichtung	erteilt	52,0	156.156
	<b>∑ Bauten</b>				<b>375,4</b>	<b>1.127.327</b>
	202		Topograph	gesch.	2,0	6.006
	203		Architekt insgesamt	6,5%	27,9	83.661
	204		Türen und Fenster	erteilt	25,2	75.676
	205		Metallmöbel	erteilt	28,0	84.084
	206		Transporte und diverse	gesch.	17,0	51.051
			<b>∑ Aufträge</b>		<b>100,1</b>	<b>300.477</b>
			<b>Reserve</b>		<b>24,0</b>	<b>72.195</b>
			<b>∑ Investitionen Bauprogramm</b>		<b>499,5</b>	<b>1.500.000</b>
				Kurs DM 1 = FCFA 333		
			∑ Aufträge erteilt		291,8	58%
			∑ Aufträge noch ausstehend		207,7	42%

## **7. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM)**

### *Schulkantinen*

Im Juni 1999 endete das Schulprogramm 1999/2000. Insgesamt ging es um 16 Schulen mit rund 2.600 Schülerinnen (40%) und Schülern (60%). Die Tagesration des PAM pro Kind bestand aus: 200 g Hirse oder Weizengrieß, 30 g Hülsenfrüchten und 15 g Öl. Mädchen erhalten eine Schulbesuchsprämie von einem Kanister Öl pro Monat, sofern sie mehr als 80 % der Zeit anwesend waren.

In 16 Schulen hat das Projekt im Schuljahr 1999/00 den monatlichen Transport der Nahrungsmittel des WEP übernommen und einen (abnehmenden) Teil der laufenden Kosten der Schulkantinen bestritten, ohne die ein normaler Schulbetrieb in diesen extremen und entlegenen Gebieten nicht gewährleistet wäre. Zugleich zahlt das Projekt Zuschüsse zu den Gehältern von Aushilfslehrern oder zur notwendigen Ausstattung (Schulkantinen, Lager etc.). Ansprechpartner sind nicht allein die Schulleiter und Lehrer, sondern auch und vor allem die associations parents élèves (APE) und die Kommunen, wenn es nämlich um den Unterhalt der Gebäude, die Bezahlung der Löhne, die laufenden Kosten für den Betrieb (Wasser, Feuerholz) und schließlich die Lehrkräfte geht, die der Staat nicht in hinreichendem Maß in diese entlegenen Orte entsendet.

Im großen und ganzen lief die Versorgung der Kantinen im Schuljahr 1999/2000 befriedigend. Mit dem Ergebnis des Schuljahres (die genauen Zahlen liegen noch nicht vor) kann man jedoch nicht zufrieden sein. Gerade die ecoles nomades sind schlecht und unregelmäßig besucht. Wahrscheinlich lässt sich nicht vermeiden, die Schulpolitik (und die Schulspeisung) grundsätzlich zu überdenken und die Förderung von Nomadenschulen an entlegenen und schwierigen Standorten gänzlich neu zu gestalten. Schulkinder, die nicht zu Hause wohnen können, brauchen mehr Unterstützung als eine Kantinenmahlzeit pro Werktag.

Die betroffenen inspections de l'enseignement fondamental (Niafunké und Diré) waren zu einer Aussprache darüber angeregt worden. Eine vom Schulamt in Diré vorgeschlagene Gesamtkonferenz aller Schulleiter schien jedoch nicht die geeignete Form. Eine Konferenz vor zwei Jahren hatte nämlich keinerlei praktische Ergebnisse erbracht. Das Engagement in den Schulen bleibt ein ungeliebtes Arbeitsfeld des Programms Mali-Nord. Mangels fachlich ausgewiesener Schulprojekte oder NRO im Norden Malis gibt es jedoch kaum Möglichkeiten, diesen Aufgabenbereich anderen zu übertragen oder zu überlassen.

### *Food for work*

Seit 1999 hat das WEP für den Ausbau einzelner Bewässerungsflächen nach eigenem Berechnungsmodus (für jeden Arbeitsschritt liegen die Mengen pro Flächeneinheit fest) Getreide (meist Hirse), Hülsenfrüchte (meist Bohnen) und (in kleinen Mengen) Öl zur Verfügung gestellt. Das Programm Mali-Nord stellte die Anträge, garantierte die zu leistende Arbeit sowie die Investitionen und übernahm den Transport sowie ggf. die Lagerung. Aus Sicht des Vorhabens waren die Erfahrungen damit überwiegend gut.



Von Januar bis Juli des Jahres hat das WEP die vereinbarten Mengen, insgesamt rund 570 Tonnen Getreide, meist ohne Verzögerungen geliefert. Über alle Fragen der Abwicklung und die unvermeidlichen Missverständnisse hat man sich letztlich problemlos verständigen können. Die Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Vertrauen und Respekt getragen. Sie kann als vorbildlich betrachtet werden.

## 8. Förderung der Kommunen

Für das Jahr 2000 stehen dem Programm aus Mitteln der TZ (Dezentralisierung II - Förderung der Kommunen - PN 1996.2223.4) TDM 500 zur Verfügung. Mit diesen Mitteln sind die folgenden, meist umfangreichen Instandsetzungs- und Umbauarbeiten in Auftrag gegeben worden:

Nr.	Kommune	Kreis	Vorhaben	Investition (FCFA)	Bemerkungen
1	Banikane	Niafunké	Rathaus	ca. 18.000.000	Im Bau
2	Koumaira	Niafunké	Rathaus	ca. 9.000.000	Im Bau
3	Niafunké	Niafunké	Kreisrat		Plan liegt vor
4	Niafunké	Niafunké	Rathaus		Plan liegt vor
5	Saraféré	Niafunké	Rathaus		Plan liegt vor
6	Goundam	Goundam	Kreisrat	6.500.000	Im Bau
7	Goundam	Goundam	Rathaus	8.700.000	fertiggestellt
8	Diré	Diré	Kreisrat	7.650.000	fertiggestellt
9	Diré	Diré	Rathaus	4.500.000	fertiggestellt
10	Bourem	Diré	Rathaus	9.125.000	fertiggestellt

Dabei handelt es sich um die vollständige Herrichtung, den Um- oder Ausbau heruntergekommener Verwaltungskomplexe aus den sechziger Jahren bzw. früherer *maisons du peuple* aus UDPM-Zeiten.

Eine Reihe von Gemeinden ist auf eigenen Wunsch bereits mit Arbeitsgerät für kleine kommunale Vorhaben ausgestattet worden (Eselskarren, Schubkarren, Schaufeln, Eimer usw.). Die meisten von ihnen wollen eine lokale Straßenreinigung und Müllbeseitigung einrichten.

Daneben haben die ersten Gemeinden Projektanträge eingereicht: Wegebau, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Marktorganisation u. ä. Léré liegt dabei an erster Stelle. Von den arbeitsintensiven Maßnahmen am Orte (vor allem arbeitsintensiver Wegebau) finanziert die Gemeinde aus eigenen Steuereinnahmen (vor allem Viehmärkte) ein Drittel der Kosten selbst.

Im Anschluss an eine Debatte im Frühjahr 2000 hatte das Programm Mali-Nord sein eventuelles Interesse signalisiert, im Rahmen der Dezentralisierungspolitik Malis die Aufgaben der *Centres de Conseil Communal* (CCC) in Diré, Goundam und Niafunké zu übernehmen. Gegen den ausdrücklichen Wunsch der Bürgermeister der betroffenen Kreise hat die Verwaltung sich für andere Projekte als Betreiber der CCC entschieden. Man wird sehen, wie die Basis das aufnimmt.

## 9. Prioritäten im Berichtszeitraum

Die erste Priorität war, den Frieden zu sichern. Die arabische Mission nach Mauretanien hat ein positives Ergebnis erzielt. Ein interkommunales Treffen in Timbuktu im September 2000 soll diesen Prozess abrunden.

Zweite Priorität waren die Vorbereitung und Durchführung des Programms der Bewässerungslandwirtschaft für das laufende Jahr: 21 Bewässerungsflächen (davon 17 mit neuen Motorpumpen) mit insgesamt 600 Hektar sind hergerichtet worden und werden bis auf einen (Weizenanbau ab November) bereits kultiviert. Daneben sind 16 Mare mit einer kultivierbaren Fläche von 4.500 Hektar mit Deichen und Wehren ausgestattet worden. Erst die laufende Saison kann erweisen, wieweit diese Maßnahmen das Wasser regulieren und ob die Investitionen die Erträge im gewünschten Umfang steigern.

Der vollständige Abschluss des Bauprogramms (KfW) hatte die dritte Priorität. Die Baustelle der Schule in Léré ist als einzige noch nicht abgeschlossen, die Arbeiten am dritten Schulblock sind noch zu beenden. Er wird zu Beginn des Schuljahrs (September/Oktober) fertiggestellt sein. Parallel dazu sollte das neue (kleinere) Bauprogramm anlaufen. Das ist geschehen. Die Aufträge für mehr als die Hälfte der Baumaßnahmen sind erteilt. Das erste Rathaus (Nampala) ist fertiggestellt.

Die Übergabe der im Rahmen früherer UNHCR-Programme geschaffenen Einrichtungen (Wasserversorgungsanlagen, Lagerhallen etc.) an die Gemeinden hatte die vierte Priorität. Bis auf eine (Koiguema) sind alle Wasseranlagen im Berichtszeitraum noch einmal überprüft, ggf. überholt und anschließend an die zuständige Gemeinde übergeben worden.

Die fünfte Priorität galt der Dezentralisierung und der Gemeindeförderung. Noch ist das Programm im wesentlichen dabei, die Voraussetzungen für eine ernsthafte Arbeit der Gemeinden zu schaffen, indem es Rathäuser baut und die Gemeinden mit den notwendigsten Arbeitsmitteln ausstattet. In allen Niederlassungen liegt hier ein deutlicher Schwerpunkt, vor allem aber in Koumaira.

Die sechste Priorität hatte schließlich dem Lac Faguibine gegolten. Statt der geplanten *journees de réflexion* haben kurze Treffen mit den betroffenen Gemeinden stattgefunden und dem Programm liegen inzwischen kondensierte (und unrealistisch umfangreiche) Entwicklungsprogramme (bzw. Forderungskataloge) der Gemeinden vor. Dies stellt bestenfalls den ersten Schritt zu einer neuen Förderstrategie am Lac Faguibine dar.

## **10. Prioritäten für das kommende Halbjahr**

- (1) Das gesamte landwirtschaftliche Investitionsprogramm - PIV und Mare - in seinen Grundzügen für 2001 und 2002 gemeinsam mit den Vertretern der Betroffenen planen und verabschieden.
- (2) Das Investitionsprogramm für 2001 in all seinen Aspekten auf den Weg bringen: von den Studien über die Bauaufträge und *Food-for-Work* Lieferungen bis hin zur rechtzeitigen Anlieferung der Motorpumpen und der Treibstofftanks.
- (3) Die Unterstützung der Schulen und der Schulkantinen neu ordnen.
- (4) Die Unterstützung der Gemeinden intensivieren und systematisieren. Das Bauprogramm (KfW und „*Appui aux Communes*“) ist Schritt für Schritt umzusetzen.
- (5) sind Die Engagements in Gourma-Rharous und am Lac Faguibine neu ordnen.

## **11. Handlungsbedarf**

Außerhalb der normalen Projektarbeit derzeit nicht erkennbar.

